



Byggherrens Verifierade Kontrollplan

Beskrivande del

För projekt: Bergsgård 1:302

Byggherre: Thi Kim Mai To och Emil Jensen

Datum: 2023-06-01 (Datum för godkännande av förslag till kontrollplan)

Upprättad av kontrollansvarig: Magnus Ackerot

Kontrollplanens Innehåll

1. Beskrivande del
2. Handlingar och organisation
3. Utförande
4. Arbetsplatsbesök
5. Hantering av material och avfallsplan
6. Slutrapport med utlåtande och intygande

Kontrollplan Del 2

Handlingar och organisation

Fastighet/Byggherre

Sida 1 (3)

Fastighetsbeteckning, byggnad nr Bergsgård 1:302 Halmstad	Fastighetsadress / Besöksadress Ljusvägen 8 302 76 Halmstad	
Byggherrens namn Thi Kim Mai To och Emil Jensen	Kontaktperson Thi Kim Mai To	
Postadress Grangatan 37	mobil 070-402 18 28	
Post nr och ort 305 64 Gullbrandstorp	mailadress kaytee@live.se	

Handlingsförteckning (X = markerade bedöms erforderliga för projektet)

Handlingsunderlag för kontrollplan framgår av bilagd ritnings- och /eller handlingsförteckning.

Handling	Datum	Anteckningar	
Beslut om bygglov	2022-04-12	Beslut nr D 2022-000426	X
Startbesked	2022-08-17	Diarienummer: BN 2022-000352	X
A-ritningar	2022-05-06	Bygghandling A-40.1-0111	X
K-Ritningar	2022-02-01	Tekniskt sektion A-40.2-0115	X
VVS-ritningar	2022-07-06	Teknikproj. Ritn nr V-59.1-0121	X
Vent.-ritningar	2022-07-06	Teknikproj. Ritn nr V-57.2, V-57-1	X
Grundritningar och konstruktionsritningar	2022-08-15	Ritn nr 15122-K15. 6 ritningar	X
Konstruktionsdokumentation	2019-05-16	Martin Thörn, Trivselhus AB	X
Geoteknisk undersökning		Provgropar görs vid byggstart.	X
Brandskyddsdokumentation	2022-05-06	Anette Henriksson, Trivselhus	X
Fuktskyddsdokumentation	2015-08-26	Fuktskyddsbeskrivning Trivselhus AB	X
Energiberäkning	2022-02-01	Mikael Andersson, Trivselhus	X
Färdigställandeskydd	2022-05-23	Gar-Bo försäkringsbrev nr 6 119 414	X

Projektbeskrivning

Nyproduktion av enfamiljshus via totalentreprenad med Trivselhus.

Ingen komplementbyggnad eller eldstad.

Tidsplan

Byggstart vecka 34, husleverans vecka 37 och färdigställande vintern/våren 2023.

Kontrollplan Del 2

Handlingar och organisation

Sida 2 (3)

Organisation

Fastighet

Bergsgård 1:302

Kontrollansvarig

Person och Företag	Magnus Ackerot. ByggKA /Co Pihab AB. Certifikat C001007, giltigt t o m 2024-12-29
Kontaktuppgifter	Gretas Gränd 3, 302 75 Halmstad. Mobil 070-276 67 50, mail: magnus@byggka.se

Projektörer

		Märkning egenkontroller	
Arkitekt	Trivselhus AB		
Byggnadskonstruktör	Trivselhus AB	EG 6.	
VVS-projektör	Nässjö Teknikprojektering AB	EG 7.	
Husleverantör/Säljare	Trivselhus/Dennis Lund		
BAS P (Projektering)	Martin Thörn, Trivselhus AB		

Genomförande

Byggtreprenör	JI-GE-Bygg (Generalentreprenör)	EG 1.	
Mark o grundentreprenör	JI-GE-Bygg (Generalentreprenör)	EG 2.	
VVS-entreprenör	JI-GE-Bygg (Generalentreprenör)	EG 3.	
El-entreprenör	JI-GE-Bygg (Generalentreprenör)	EG 4.	
Kakel och klinker	JI-GE-Bygg (Generalentreprenör)	EG 5.	
Eldstad/Rökgaskanal	Ej aktuell	SAK 1.	
SAK Brand	Anette Henriksson / Trivselhus	SAK 2.	
SAK OVK	Oscar Hanson VVS	SAK 3.	
BAS U (Utförande)	JI-GE-Bygg (Generalentreprenör)		
Byggleddare Husleverantör	Rasmus Silverin Trivselhus AB	EG 8.	

° Kontroll enligt kontrollplan sker genom dokumenterad egenkontroll.

° Byggarbetsplatsmiljösamordnaren skall framta arbetsmiljöplan och anslå denna på byggarbetsplatsen innan arbeten påbörjas.

Egenkontroller vid Projektering

Område	Lagkrav	Egenkontroller utförda av	OK
Tillgänglighet	BBR 3:1-3:5	AH / Trivselhus AB	OK
Brandsäkerhet	BBR 5:12	Anette Henriksson, Trivselhus	OK
Konstruktion	EKS11	John Karlsson, Byggkonsult i Vetlanda AB	OK
VVS	BBR 6:625, 6:63	Filip M / Nässjö TeknikProjektering AB	OK
Ventilation	BBR 6:254	Filip M / Nässjö TeknikProjektering AB	OK

Kontrollplan Del 2

Handlingar och organisation

Sida 3 (3)

Övrigt

Kontrollansvarig enl PBL deltar i följande samråd och besiktningar	Tekniskt samråd. Slutbesiktning (entreprenadbesiktning enligt avtalshandlingar) och Slutsamråd.
Kontrollansvarige gör arbetsplatsbesök vid minst följande tillfällen (utöver deltagande i besiktningar)	1. När betongplattans form och armering färdigställts, dvs innan gjutning. 2. När byggnadsstomme och yttertakets underlagstak har färdigställts och innan isoleringsarbeten påbörjats. 3. Inför start av ytskikt i våtrum. 4. Arbetsplatsbesök enligt PBL 10 kap 27§ sker tillsammans med representant från kommunen vid tätt hus.
Handlingar ingående i kontrollplan.	1. Kontrollbeskrivning, Del 1 2. Kontrollplan, organisation och handlingar, Del 2 3. Kontrollplan utförande, Del 3 4. Arbetsplatsbesök, dokumentation 5. Slutrapport (slutrapporten är utlåtande enligt PBL, kap 10 §11 pkt6.)
CE-märkning	PBL 8:21 Bestämmelser om CE-märkning ska följas

Kontrollplan Del 3

Utförande

Sida 1 (4)

Projektnamn	Bergsgård 1:302
Entreprenadsform	Totalentreprenad
Fastighetsbeteckning	Bergsgård 1:302
Byggherre/Sökande (BH)	Thi Kim Mai To och Emil Jensen
Kontrollansvarig enl PBL (KA) utsedd av BH	Magnus Ackerot. Certifikat C001007

Denna kontrollplan har till uppgift att säkerställa att gällande lagar, förordningar och föreskrifter uppfylls. Projektörer och entreprenörer skall utföra egenkontroller av sina åtaganden. Innan byggnaden får tas i bruk skall besiktning utföras av sakkunnig person. När samtliga kontroller är utförda och handlingar enligt denna kontrollplan tagits fram insändes kontrollplanen av kontrollansvarig enl PBL till Byggnadsnämnden, för utfärdande av slutbevis. **Kontrollplanen är uppställd enligt BBR 29. Konstruktionsdokument enligt EKS 11.**

Aktuella åtgärder skall kontrolleras och signeras när kontrollen utförts eller när egenkontroller erhållits.

EKS = Boverkets författningssamling, BBR = Boverkets Byggregler, MB = Miljöbalken

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling, GVK = Svensk Våtrumskontroll

BLOV = Beslut om bygglov, PBL = Plan och Bygglov, BBV = Byggkeramikrådet

Kontroll sätt och ansvar kontroll:

EG = Entreprenörs egenkontroll, uppvisad och överlämnad till byggherre.

SAK = Utlåtande från sakkunnig eller fristående kontrollorganisation mottagits. Avseende lägeskontroll, när anmälan om inmätning gjorts till sakkunnig. BH = Byggherres ansvar.

Rond = Arbetsplatsbesök och slutrapport av kontrollansvarig med stickprovskontroll.

BES = Besiktning av kontrollansvarig eller besiktningsman. Mätning = Mätning på beprövat sätt.

	Aktivitet	Krav	Handling	Kontroll sätt / Ansvarig kontroll	Kontroll datum
1	Startbesked	PBL 10:23	Dokument	BH	2022-08-17
2	Överensstämmelse med beviljat bygglov. Omfattning av kontroll: Att lägeskontroll är begärd, förutänts omfatta läge i sida och höjd inkl byggnadshöjd, vinkelmått, ytmått enligt bygglov / planbestämmelser. Okulär avstämning av exteriör utformning samt utformning med hänsyn till användningssätt enligt bygglov.	BLOV	Bygglovs-handlingar	Rond / BH	2023-06-01
	1. Bygghandlingars riktighet				
10	Bärförmåga, stadga, beständighet	EKS 11	Ritning	EG / EG 2.	2022-08-11
11	Brandprojektering	BBR 5:12	Dokument	EG / EG 6.	2022-08-11
12	Energikrav, Energihushållning	BBR kap 9	Energiberäkning	EG / EG 6.	2022-08-11
13	Luftbehandling	BBR 6:2	Ritning	EG / EG 6.	2022-08-11
14	VA-Handlingar	BBR 6:6	Ritning	EG / EG 7.	2022-08-11
15	Värmehandlingar	BBR 6:4	Ritning	EG / EG 6.	2022-08-11
16	Elhandlingar	ELSÄK	Ritning	EG / EG 6.	2022-08-11
17	Fuktsäkerhetsprojektering	BBR 6:5	Dokument	EG / EG 6.	2022-08-11

Kontrollplan Del 3

Utförande

Sida 2 (4)

	Aktivitet	Krav	Handling	Kontroll sätt / Ansvarig kontroll	Kontrolldatum
	2. Utförande och driftsinstruktioner				
20	Drift och skötselinstruktioner	BBR 2:5		Rond /BH	2023-06-01
21	Funktionsprovning (enligt entreprenadsbesiktning)	BBR 2:321		EG / BH	2023-06-01
	3. Utformning				
30	Lägeskontroll	BLOV	Bygglövsritning	SAK	2022-12-28
31	Tillgänglighet, Dörrbredder på entréplan	BBR 3:143	Bygglövsritning	Mätning/ BH	2023-06-01
	Möblering tillgängligt i hygienrum	BBR 3:146	Bygglövsritning	Mätning/ BH	2023-06-01
	Nivåskillnader inom entréplan finns inte	BBR 3:147	Bygglövsritning	Rond/BH	2023-06-01
	Trösklar är fasade och inte för höga	BBR 3:143	Bygglövsritning	Rond/BH	2023-06-01
32	Utrymme för Installationer och utrustning	BBR 3:4	Bygglövsritning	EG /BH	2023-06-01
	4. Bärförmåga, stadga och beständighet				
40	Mottagnings- och utförandekontroll	BBR 2.322	Konstruktions-ritningar	EG / EG 1.	2022-12-01
41	Kontroll av stomme och tak (BBR 2:31 vid beprövade lösningar som inte framgår av K-Handling)	EKS 11	Bygghandling	Okulärt / EG 1.	2022-12-01
42	Underlag inför lyft av byggnad	BBR 2:31	Grundritning	EG / EG 2.	2022-10-06
43	Geotekniskt = K-ritningar följs	PBL	Dokument	EG / EG 2.	2022-09-13
44	Besiktning schaktbotten	EKS 11	Grundritning	EG / EG 2.	2022-09-13
45	Packat underlag för grundläggning	EKS 11	Grundritning	EG / EG 2.	2022-10-06
46	Grundläggning - armering, tätning, utförande	Bygghandling	Grundritning	EG / EG 2.	2022-11-09
47	Sprängning, följa allmänna råd	BBR 2:4		EG / EG 2.	Ej aktuellt
	5. Brandskydd				
51	Skydd mot brandspridning mellan byggnader. Tabell 5:611 Skyddsavstånd	BBR 5:6	Brandskydds-dokumentation	EG / EG 8.	2023-06-01
52	Brandsäkerhet enligt brandskydds-dokumentation	BBR 5:12	Brandskydds-dokumentation	EG / EG 8.	2023-06-01
53	Brandvarnare	BBR 5:353	Br. Dokument	EG / EG 1.	2023-06-01
54	Imkanal	BBR 5:5332	Ritning	EG / EG 1.	2023-04-20
	6. Hygien, hälsa och miljö				
60	Dränering byggnader	BBR 6:532	Grundritning	EG / EG 2.	2022-10-06
61	Kapillärbrytande material	BBR 6:532	Grundritning	EG / EG 2.	2022-10-06
63	Varmvattentemperatur (Vid tappställe min 50°, max 60°C) (Min temp i beredare 60°C)	BBR 6:621		EG / EG 3.	2023-05-31
64	Fuktsäkerhet	BBR 6:532	Dokument	EG / EG 1.	2023-03-20
65	Kontroll av fukt i konstruktioner	BBR 6:52		EG / EG 1.	2023-03-20
66	Våtrum - tätskikt, fall och genomföringar	GVK / BBV	Ritning	EG / EG 5.	2023-05-30
67	Hantering och förvaring av material	BBR 2:322, BBR 6:52		Okulärt / EG 1.	2022-12-01
68	Skydd av färdiga konstruktioner	BBR 6:52		EG / EG 1.	2022-12-01

Kontrollplan Del 3

Utförande

Sida 3 (4)

	Aktivitet	Krav	Handling	Kontroll sätt / Ansvarig kontroll	Kontrolldatum
69	Provtryckning av vattenledning	BBR 6:625		EG / EG 3.	2023-05-31
70	Termiskt klimat	BBR 6:4	Ritning	EG EG 1.	2023-05-31
71	Skydd mot skadedjur (Musskydd och insektsnät)	BBR 6:8	Ritning	EG / EG 1.	2022-12-11
72	Radon (Tätningar och genomföringar i platta)	BBR 6:23	Grundritning	EG / EG 2.	2022-11-09
	7. Bullerskydd				
76	Ljudförhållande, Isolerande åtgärder	BBR 7:21	Ritning	EG / EG 1.	2023-06-01
	8. Säkerhet vid användning				
80	Tillträdes- och skyddsanordningar på tak	BBR 8:24	Bygghandling	EG / SAK	2023-06-01
81	Glas i byggnad	BBR 8:35		EG / EG 6.	2023-06-01
82	Barnsäkerhet	BBR 8:23 BBR 8:3 BBR 8:4. BBR 8:6. BBR 8:9		Rond / BH	2023-06-01
83	Skydd mot fall	BBR 8:2. BBR 8:9		EG/Rond	2023-06-01
84	Skydd mot elstötter och elchock (Installation utförd under ledning av behörig elektriker)	BBR 8:8. ELSÄK	Elritning	EG / EG 4.	2023-05-25
	9. Energihushållning				
91	Arbetsutförande isolering	BBR 9:2	K-Handling	EG / EG 1.	2023-04-25
92	Maximal installerad effekt	BBR 9:2 A		EG / EG 8.	2023-05-31
93	Reglersystem	BBR 9:52	Bygghandling	EG / EG 4.	2023-05-25
94	Mätsystem	BBR 9:7	Bygghandling	EG / EG 4.	2023-05-25
95	Klimatskärm och tryckprovning av huset	BBR 9:26	Bygghandling	EG / EG 1.	2023-05-31
96	Verifikation energianvändning	BBR 9:2		Beräkning	2023-06-01
	Övrigt				
100	Luftflödesprotokoll (OVK protokoll)	BBR 6:251	Vent-ritning	EG alt SAK	2023-05-31
102	Plan för hantering av material och avfalls- hantering finns och verifieras efter byggnation i kontrollplanen.	PBL 10:6	Kontrollplanen	Rond	2023-06-01
103	Provtryckning av golvvärme	BBR 9:94		EG / EG 3.	2023-05-31
104	Hantering av Dagvatten, Installation	BBR6:642	Bygghandling	EG / EG 2 / BH	2023-05-31


Kontrollplan Del 3

Utförande

Sida 4 (4)

	Aktivitet	Krav	Handling	Kontroll sätt / Ansvarig kontroll	Kontroll datum
	Besiktningar				
110	Slutbesiktning (Konsumenttjänstlagen, ev villkor i färdigställandes försäkring)			BES	2023-06-01
111	Slutsamråd / Slutavstämning	PBL 10:30	Tekn samråd	BES/Rond	2023-06-01

Datum: 2023-06-01




Underskrift kontrollansvarig Magnus Ackerot
Kontroller enligt ovan genomförda

Datum: 2023-06-01



Underskrift Byggherre: Thi Kim Mai To
Kontroller enligt ovan genomförda



Underskrift Byggherre: Emil Jensen
Kontroller enligt ovan genomförda

I den mån det förekommer avvikelser notering vid slutavstämning görs bedömning av KA beroende på komplexitet om intygande av åtgärd kan bestyrkas av byggherre alternativt det är lämpligt med uppföljande besök av kontrollansvarige.

Byggherre har alltid möjlighet att begära uppföljande kontroll av kontrollansvarig.

4. Arbetsplatsbesök genomförda av kontrollansvarig

Sammanställning över genomförda platsbesök



Fastighet/Byggherre

Fastighetsbeteckning: Bergsgård 1:302	Fastighetsadress / Besöksadress Ljusvägen 8 302 76 Halmstad
Byggherrens namn: Thi Kim Mai och Emil Jensen	
Sammanställning över genomförda platsbesök	

Besök 1.

Datum för besöket: 2022-09-13		
Syfte med besöket: Mark och grundarbeten, samt kontroll av egenkontroller		
Kommentarer: Kollat markbädd / OK 2022-11-09, Kollat grund inför gjutning. Inget att anmärka på / OK		

Besök 2.

Datum för besöket: 2022-12-01		
Syfte med besöket: Kontrollera stomme, arbetsplats och egenkontroller		
Kommentarer: Kollat stommontage, vilket ser bra och okey ut. Egenkontroller på plats.		

Besök 3.

Datum för besöket: 2022-12-28		
Syfte med besöket: Arbetsplatsbesök med kommunen enligt PBL 10 kap 27§.		
Kommentarer: Se protokoll. Inget att anmärka på. Huset stått länge utan takpannor. Fuktkontroll! lägeskontroll utförd utförd /OK.		

Besök 4.

Datum för besöket: 20-05-03		
Syfte med besöket: Kontrollera tätskikt i våtrum samt egenkontroller		
Kommentarer: Tätskikt OK. Egenkontroller på plats.		

Besök 5.


Datum för besöket: 2023-06-01		
Syfte med besöket: Rond inför slutsamråd och besiktning		
Kommentarer: Kollat barnsäkerhet och brandskydd. Allting Ok inför slutsamråd.		

4. Arbetsplatsbesök genomförda av kontrollansvarig

Bilder från arbetsplatsbesök



4. Arbetsplatsbesök genomförda av kontrollansvarig

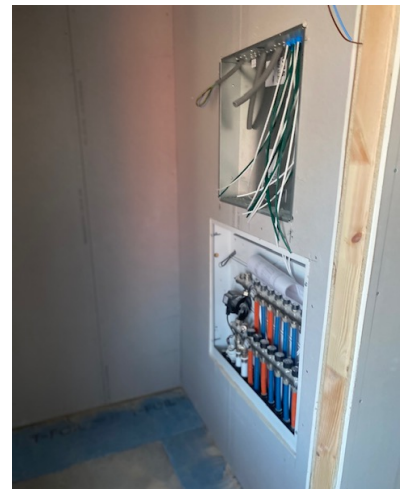

5. Hantering av material och avfallsplan



Fastighet/Byggherre

Fastighetsbeteckning: Bergsgård 1:302	Fastighetsadress / Besöksadress Ljusvägen 8 302 76 Halmstad
Byggherrens namn: Thi Kim Mai To och Emil Jensen	
Hantering av material och avfall under byggtiden	

Lagstiftning: PBL 10 kap. 6§. Samt avfallsförordningen.

Vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, och vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra

- a) materialåtervinning av hög kvalitet, och
- b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Lag (2020:603) .

Hantering olika material (Mängder och åtgärder verifieras efter byggtid)

Material	Mängd	Deponi	Återvinning	Åter-användning		
Trä	50 kg		X			
Betong, tegel, klinker	140 kg			X		
Metall	0					
Glas	0					
Plast	20 kg		X			
Gips	0					

Hantering av eventuella farliga ämnen:

Övriga kommentarer på material och avfallshantering

Denna hustyp är ett sk modulhus där det mesta monteras och görs i fabrik, därför mycket lite avfall avseende byggmaterail eller emballage.

Denna plan verifieras på sista sidan i slutrapport i denna kontrollplan

6. Slutrapport

Utlåtande enligt PBL Kap 10 § pkt 6.

1 (2)

Noteringar i detta protokoll tar endast upp observationer som berör lag- och normkrav.



Datum: 2023-06-01	Besök vid besiktning och slutsamråd

Fastighet/Byggherre

Fastighetsbeteckning: Bergsgård 1:302	Fastighetsadress / Besöksadress Ljusvägen 8 302 76 Halmstad
Byggherrens namn: Thi Kim Mai To och Emil Jensen	

Deltagare vid besöket

Namn	Företag/Organisation
Thi Kim Mai	Byggherre
Emil Jensen	Byggherre
Arber Maloku	Halmstad Kommun
Magnus Ackerot	Kontrollansvarig

Noteringar vid besöket (Observerade avvikelser mot normkrav)

Nummer	Notering	Hänvisning

Av entreprenör / ansvarig anmäld avvikelse

Nummer	Anmäld av	Notering / typ av avvikelse	Avvikelse rapport

Kontroll och provning Datum noteras när dokument uppvisats eller EG utförts

Kontrolltyp/Besiktning	Datum i dokument	Utfärdat av	Överlämnat till byggherre	Lämnat till KA	Lämnat till kommun
Besiktningsprotokoll Imkanal	2023-04-20	Egenkontroll Bygg	X	X	
OVK protokoll med bilaga luftflödesprotokoll	2023-05-31	Oscar Hanson VVS	X	X	X
Lägeskontroll	2022-12-28	Halmstad Kommun	X	X	X
Verifierad energiberäkning	2023-06-01	Mikael Andersson / Trivselhus	X	X	X
Brandskyddsdocumentation	2023-06-01	Anette Henriksson / Trivselhus	X	X	X

Övriga viktiga dokument

Kontroll mindre arbeten EL	2023-05-25	Jonas Bengtsson	X	X
Provtryckning klimatskal	2023-05-31	Projekthuset Lyrn	X	X
Kvalitetsdokument våtrum BBV	2023-05-30	Ryko Plattsättning	X	X
Kontroll Säker Vatten med bilagor samt provtryckningsprotokoll golvvärme	2023-05-31	Sol & Värme i Halmstad AB	X	X

6. Slutrapport

Utlåtande enligt PBL Kap 10 § pkt 6.

2 (2)

Kontrolltyp/Besiktning	Datum i dokument	Utfärdat av	Överlämnat till byggherre	Kopia överlämnat till Kontrollansvarig
Egenkontroller som skall till byggherre och kontrollansvarig				
Egenkontroller Mark och grund	2022-10-02	MGAB	X	X
Egenkontroller Bygg	2023-03-31	JI-GE-Bygg (Generalentreprenör)	X	X
Egenkontroller Ventilation	2023-03-31	JI-GE-Bygg (Generalentreprenör)	X	X
Egenkontroller VVS	2023-05-31	Sol & Värme i Halmstad AB	X	X
Egenkontroller EL	2023-05-25	Jonas Bengtsson	X	X
Egenkontroller Kakel o klinker	2023-05-30	Ryko Plattsättning	X	X
Fuktmätning	2023-03-31	JI-GE-Bygg (Generalentreprenör)	X	X

Kontrollansvariges övriga noteringar och utlåtande

Bygget har genomförts på ett professionellt sätt och i linje med kontrollplanen. Samhällets krav och Boverkets regler har uppfyllts på ett tillfredställande sätt. Egenkontroller har gjorts av berörda entreprenörer och Kontrollansvarig har gjort erforderliga besök. Avfallsplan har följts enligt denna kontrollplan. Huset är målat i rätt kulör, se bilder från arbetsplatsbesök. Jag anser att ett slutbesked kan ges.

Kontrollansvariges intygande

(Kontrollansvarige intygar att:)

kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna har följts samt att nödvändiga kontroller har utförts.

kontrollansvarige har närvarat vid tekniskt samråd och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

kontrollansvarige har dokumenterat sina byggplatsbesök och noterat iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked.

kontrollansvarige har informerat byggherren om avvikelser från föreskrifter och villkor, och vid behov även byggnadsnämnden.

kontrollansvarig inte själv utfört byggnadsarbeten som denna kontrollplan gäller för, och att kontrollansvarig inte heller står i anställnings- eller släktskapsförhållande till de som utfört arbeten.

Hantering av byggmaterial och avfallshantering har skett enligt lagstiftning och dokument i denna kontrollplan.

Halmstad 2023-06-04

Kontrollansvarig Magnus Ackerot

Noteringar i detta protokoll tar endast upp observationer som berör lag- och normkrav.
